

건설교통과 소관

1. 건설사업 추진현황 및 사업별 시행내역(도로건설·포장, 하수도, 소규모 주민숙원사업, 도로시설물 정비 등)
2. 인도 및 연석정비 실적
3. 가로등, 방범등 설치현황 및 수선비 지출내역
4. 하천 및 도로부지 점용허가에 따른 사용료 부과·징수현황 ('95년이후)
5. 도로굴착 원상복구 원인자 부담금 집행현황 및 원상복구후 하자보수 실적
6. 과불보상금 환수현황
7. 풍수해 및 설해대책용 자재구입 및 사용현황
8. 각종 건설사업 설계변경에 따른 추가공사비 집행내역
9. 보차도 설치허가 현황 및 사용료 징수현황
10. 교통유발부담금 부과·징수 및 체납현황
11. 불법 주·정차 단속실적 및 과태료 부과·징수현황
12. 폐·방기차량 수거 및 단속실적
13. 견인대행업소 견인수수료 수입 및 지출현황
14. 상인·두류 공영주차장 관리 및 운영실적
15. 버스승강장 및 부대시설 설치·정비내역
16. 차고지 관리 및 지도감독내역
17. 자동차 운수사업 지도·감독내역(화물자동차 적발단속 및 과징금 부과통지 현황 포함)
18. 불법 노숙차량 단속실적 및 과태료 부과현황

1. 건설사업 추진현황 및 사업별 시행내역

(도로축조, 하수도, 소규모 주민숙원사업, 도로시설물 정비등)

□ 총괄표

(단위 : 백만원)

구분	건수	사업개요	사업비	추진내용					비고 (미발주)
				소계	설계중	발주중	시공중	준공	
합계	78		19,500	78	12	4	14	47	1
도로건설	24	B-6~20M L=3,409M	16,001	24	2	4	8	10	
도로포장	22	B-6~10M L=12,676M	2,216	22	7	-	3	12	
하천 및 하수도	10	B-3~8M L=3,010M	1,749	10	-	-	2	7	1
소규모 주민숙원 사업	8	관내일원	270	8	-	-	-	8	
도로보수	12	관내일원	194	12	2	-	1	9	
도로 시설물 정비	2	관내일원	70	2	1	-	-	1	

□ 도로건설

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
계 : 24건	B=6~20M L=3,409M	16,001			<ul style="list-style-type: none"> · 준 공 10건 · 시 행 중 8건 · 발 주 중 4건 · 설 계 중 24 	
대곡지구~진월 초교남편 도로 건설	B= 15M L= 200M	계: 2,000 공: 300 보: 1,700	98. 7.15 ~ 99. 1.10	5	<ul style="list-style-type: none"> · 공사중지(98.7.21) · 토11, 지7미협의 	
진천동 유천교 ~진월초교 도로건설	B= 8M L= 190M	계: 1,100 공: 120 보: 980	98. 6.10 ~ 98. 9. 7	100	준 공	
상인2동 원덕 마을내 도로 건설	B= 8M L= 73M	계: 420 공: 42 보: 378	98. 5.20 ~ 98. 8.17	100	준 공	
월배세차장~ 월성동간 도로 건설	B= 8M L= 150M	계: 550 공: 90 보: 460	98. 5.27 ~ 98. 9.23	100	준 공	
월배공단 진입로 ~월배초교간 도로건설	B= 8M L= 150M	계: 800 공: 90 보: 710	98. 5.22 ~ 98. 8.19	100	준 공	
상인2동 달비 마을내 도로 건설	B= 8M L= 224M	계: 1,050 공: 250 보: 800	98. 6.10 ~ 98.12.21	30	<ul style="list-style-type: none"> · 보상협의 완료 · 공사중 	
송현2동 송현 초교 서편 도로 건설	B= 8M L= 170M	계: 750 공: 70 보: 680	98. 6.15 ~ 98.10.12	100	준 공	
월배로~월성동 간 도로건설	B= 8M L= 120M	계: 600 공: 70 보: 530	98. 5.27 ~ 98. 8.24	100	준 공	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
장기동 구마 고속도로 서편 도로건설	B= 6M L= 100M	계: 600 공: 90 보: 510	98. 5.25 ~ 98.11.27	90	· 포장완료	
진천동 유천 마을진입 도로 건설	B= 6M L= 200M	계: 500 공: 100 보: 400	98. 6.10 ~ 98.10. 7	100	준 공	
두류2동사무소 북편 도로건설	B= 6M L= 70M	계: 500 공: 40 보: 460	98. 5.25 ~ 98.12.17	90	· 포장완료	
진천동 성로원 진입도로 건설	B= 10M L= 250M	계: 1,000 공: 200 보: 800	-	-	설 계 중	
진천동 진천 초등서편 도로 건설	B= 8M L= 130M	계: 600 공: 80 보: 520	98. 6. 9 ~ 98.10. 6	100	준 공	
진천동 월배로~ 진천천간 도로 건설	B= 8M L= 100M	계: 510 공: 70 보: 440	98. 6.18 ~ 98. 9.15	30	· 공사중지(98. 8.21) · 토1,지2미협의	
본동 가무내 도로건설	B= 8M L= 86M	계: 400 공: 50 보: 350	98. 5.28 ~ 98.12.20	80	· 흙관 및 측구 완료	
상인2동 원덕 마을내 도로 건설	B= 8M L= 130M	계: 500 공: 54 보: 446	98. 5.27 ~ 98. 8.24	100	준 공	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
장기동사무소 (구)남편 도로 건설	B= 6M L= 120M	계: 500 공: 72 보: 428	98. 6.12 ~ 98.12. 4	80	· 포장완료	
두류동 840-55 번지선 도로 건설	B= 6M L= 70M	계: 500 공: 42 보: 458	-	-	· 설계 중 · 지적 불부합	
진천동 하나로 맨션 도로건설	B= 8M L= 120M	계: 445 공: 75 보: 370	98. 5.22 ~ 98. 8.19	100	준 공	
상인2동 달비 마을내 도로 건설	B= 8M L= 250M	계: 297 공: 40 보: 257	98. 6.15 ~ 98.10.12	5	· 공사중지(98.8.20) · 한전전력구 사공중	
진천동 하나로 APT남편 도로 건설	B= 8M L= 200M	계: 993 공: 130 보: 863	-	-	설계완료	
장기동 283~274 번지선 도로 건설	B= 6M L= 120M	계: 296 공: 72 보: 224	-	-	설계완료	
죽전동 우방APT (용산군인)동편 도로건설	B= 10M L= 111M	계: 800 공: 100 보: 700	-	-	설계완료	
진천동 대동APT 남편 도로건설	B= 8M L= 75M	계: 290 공: 40 보: 250	-	-	설계완료	

□ 도로포장

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
계 : 22건	B=6~10M L=12,676M	2,216			· 준 공 12건 · 시 행 중 3건 · 설 계 중 7건	
두류1동 명서로 (양편)인도 포장 공사	B= 4.8M L= 540M	88	98.10. 7 ~ 98.12. 5	95	· 경계석 교체완료 · 포장완료	
두류1동 성당로 인도 포장공사	B= 4.8M L= 786M	160	98. 9.24 ~ 98.12.26	95	· 경계석 교체완료 · 포장완료	
송현2동 100-1 번지선의 1개소 ASP 덧씌우기	B=6~8M L= 355M	29	98. 8. 1 ~ 98. 9. 9	100	준 공	
성당동 825-16 번지선 인도 브릭개체공사	B= 4.8M L= 300M	49	98. 8.14 ~ 98.10.12	100	준 공	
성당동 663-7 번지선의 1개소 인도브릭 교체 공사	B= 3.8M L= 289M	37	98. 8. 6 ~ 98.10. 4	100	준 공	
성당동 654-20 번지선 인도 축소공사	B=3→2M L= 260M	40	-	-	설 계 중	
본리동 110번지선 인도브릭 교체 공사	B= 4M L= 330M	52	98.10. 7 ~ 98.12. 5	95	· 경계석개체완료 · 포장완료	
본리동 336 번지선의 4개소 ASP포장공사	B=4.5~7M L= 610M	37	98. 5.15 ~ 98. 6.23	100	준 공	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
대남초등학교 주변 ASP포장 공사	B= 8M L= 684M	60	98. 5.15 ~ 98. 6.22	100	준 공	
본동 641-22 번지선의 1개소 ASP포장공사	B=6~10M L= 450M	39	98.10. 8 ~ 98.11.17	100	준 공	
본동 810번지선의 1개소 ASP포장 공사	B= 8M L= 375M	33	98.10. 2 ~ 98.11.10	100	준 공	
감삼동 128-1 번지선의 5개소 ASP포장공사	B=6~8M L=1,130M	81	98. 9. 8 ~ 98.10.17	100	준 공	
이곡동1000-126 번지선의 2개소 인도 개체공사	B=3~6M L= 220M	43	-	-	설 계 중	
두류동 150-21 번지선 인도 개체공사	B= 4M L= 150M	20	98. 4. 4 ~ 98. 5. 3	100	준 공	
두류동 89-14 번지선 인도 개체공사	B= 3.5M L= 680M	81	-	-	설 계 중	
장기동 180-14 번지선 ASP 포장공사	B=6~8M L= 284M	22	98. 4. 8 ~ 98. 5. 7	100	준 공	
감삼동 49-11 번지선의 7개소 ASP포장공사	B=5~8M L= 775M	50	-	-	설 계 중	
죽전동 250-15 번지선의 7개소 ASP포장공사	B=4~8M L= 738M	49	98. 8. 1 ~ 98. 9. 9	100	준 공	
이곡동 1000-99 번지선의 1개소 ASP포장공사	B=4~6M L=1,220M	72	98. 4.16 ~ 98. 5.25	100	준 공	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추 진 상 황	비고
성당2동 달서시영 APT주변 도로 정비	B= 3M L=2,500M	200	-	-	설 계 중	
성서택지 도로 시설물 정비	도로표지판 N=62개소 인도보완시공	688	-	-	설 계 중	
대곡택지 도로 시설물 정비	자전거도로 및 인도 보완시공	286	-	-	설 계 중	

□ 하 수 도

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추 진 상 황	비고
계 : 10건	B=3~35M L=3,010M	1,749			<ul style="list-style-type: none"> · 준 공 7 · 시행중 2 · 미발주 1 	
월배초등학교 서편 하수도 및 포장	B= 3M L= 170M	65	98. 4. 9 ~ 98. 5.18	100	준 공	
월배천주교회 주변 인도 및 하수도 개제	B=3~4M L= 230M	60	98. 4. 6 ~ 98. 5.15	100	준 공	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	진도 (%)	추진 상황	비고
동산APT주변의 1개소 하수도 및 포장	B= 4M L= 190M	50	98. 4. 9 ~ 98. 5.18	100	준 공	
대곡동 갈밭 마을 진입로 하천정비	B=2~3M L= 180M	130	98. 4.23 ~ 98. 7.11	100	준 공	
도원동 수발천 하상 및 하수도 정비	하상정비및 석축(제 방)보수 L= 432M	100	98. 4.22 ~ 98. 6. 8	100	준 공	
면간도로 확장,포장공사	B=5~8M L= 500M	150	98. 5.27 ~ 98.11.30	70	포장 준비중	
구마고속도로 주변 하수도 및 포장공사	B=2~3M L= 343M	74	98. 5.27 ~ 98. 7.25	100	준 공	
소하천 정비	관내일원	70	98. 1. 3 ~ 98. 12.30	70	연 간 시 행	
기성제 정비	B= 4M L= 890M	50	98. 3.26 ~ 98. 4.13	100	준 공	
대 명 천 복개공사	B= 35M L= 75M	1,000	-	-	미발주 (’98.시비보조 미배정)	

□ 소규모 주민숙원사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	공사기간	진도 (%)	추진상황	비고
계 : 8건	-	270			준공 8건	
감삼동 청구 APT 주변 정비 공사	아스콘덧씌우기 A= 21.63a 흙관부설 L= 39M 집수정설치 N= 10개소	24	98. 8.26 ~ 98. 9.24	100	준 공	
면간도로~월암 마을간 도로 포장공사	도로포장 B=3.2~5.0M L= 728M	44	98. 8. 8 ~ 98. 9.23	100	준 공	
두류3동사무소 ~두류정수장간 인도정비공사	소형고압브릭포장 A=1,397m' 보차도경계석설치 L=412M	59	98. 8. 5 ~ 98.10. 3	100	준 공	
영남고네거리 북편 자전거 보관대설치공사	자전거보관대설치 N=9조 (77대)	31	98. 9. 3 ~ 98.10.22	100	준 공	
관내 과속방지턱 도색	과속방지턱도색 N= 86개소	46	98. 9.16 ~ 98.10.25	100	준 공	
파산동 164번지선 인도 정비공사	소형고압브릭포장 A=409m'	16	98.10. 1 ~ 98.10.30	100	준 공	
성당동 54-1번지 선의 156개소 포장긴급보수공사	아스팔트포장보수 A=49a	40	98. 9.28 ~ 98.10. 2	100	준 공	
앞산등산진입로 계단설치공사	계단설치L=5.7M 난간설치L=13.0M	10	98.10.21 ~ 98.11.19	100	준 공	

□ 도로보수

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	공사기간	진도 (%)	추진상황	비고
계 : 12건		194			<ul style="list-style-type: none"> · 준 공 9 · 시행중 1 · 설계중 2 	
1/4분기도로보수	관내일원 (1식)	12	98. 1. 1 ~ 98. 3.31	100	준 공	
2/4분기도로보수	관내일원, (1식)	13	98. 4. 1 ~ 98. 6.30	100	준 공	
3/4분기도로보수	관내일원 (1식)	14	98. 7. 1 ~ 98. 9.30	100	준 공	
4/4분기도로보수	관내일원 (1식)	12	98.10. 1 ~ 98.12.31		· 도로기동반 운영 보수중	
앞산순환도로 인도 배수처리공사	배수로설치 L=236M	18	98. 6.29 ~ 98. 7.18	100	준 공	
성당주공APT북편외 16개소 도로시설물 긴급 보수	경계석개체 L= 100M 인도정비 A= 719m ²	16	98. 7. 4 ~ 98. 7.21	100	준 공	
영남고네거리외 3개소 교통시설물 보수공사	탄력봉설치외 3건	8	98. 7.13 ~ 98. 8. 1	100	준 공	
그린코아주변외 2개소 도로시설물 긴급보수공사	경계석개체 L= 44M 인도정비 A=1,836m ²	20	98. 9.18 ~ 98. 9.27	100	준 공	

사 업 명	사업개요	사업비	공사기간	진도 (%)	추진상황	비고
도원동간 석축 공사	석축설치 A= 148m'	15	98. 8.18 ~ 98. 9. 2	100	준 공	
달서구청 남편보성 APT앞외 7개소 도로시설물긴급보수	경계석개체 L= 88M 인도정비 A=1,797m'	20	98. 9.18 ~ 98. 9.26	100	준 공	
시각장애인시설 보완공사	-	24	-	-	설 계 중	
관내 도로시설물 긴급 보수공사	-	22	-	-	설 계 중	

□ 도로시설물 정비

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	공사기간	진도 (%)	추진상황	비고
계 : 2건	-	70	-	-	· 준 공 1건 · 설 계 중 1건	
관내 교량·육교 시설물 정비	교량 4개소 육교 6개소	20	97. 1. 3 ~ 97.12.30	-	설 계 중	
과속방지턱 설치	관내일원	50	98. 6.30 ~ 98. 8. 8	100	준 공	

2. 인도 및 연석 정비실적

사 업 명	사업개요	사 업 비	공사기간	비 고 (진도%)
계 : 10건	-	521		
두류1동 명서로(양편) 인도포장공사	경계석개체L= 428M 인도정비 A=1,699m'	88	98.10. 7 ~ 98.12. 5	80
두류1동 성당로 인도포장공사	경계석개체L= 784M 인도정비 A=3,016m'	160	98. 9.24 ~ 98.12.26	80
성당동 825-16번지선 인도브릭개체공사	경계석개체L= 336M 인도정비 A=1,403m'	49	98. 8.14 ~ 98.10.12	100
성당동 663-7번지선외 1 개소 인도브릭개체공사	경계석개체L= 238M 인도정비 A= 790m'	37	98. 8. 6 ~ 98.10. 4	100
본리동 110번지선 인도브릭개체공사	경계석개체L= 331M 인도정비 A=1,035m'	52	98.10. 7 ~ 98.12. 5	70
두류동 150-21번지선 인도브릭개체공사	인도포장 A= 646m'	20	98. 4. 4 ~ 98. 5. 3	100
그린코아옆의 2개소 도로시설물 긴급보수	경계석개체L= 44M 인도정비 A=1,836m'	20	98. 9.18 ~ 98. 9.25	100
달서구청 남편 보성 APT앞의 7개소 도로 시설물긴급보수	경계석개체L= 88M 인도정비 A=1,797m'	20	98. 9.18 ~ 98. 9.26	100
성당주공 북편의 16 개소 도로시설물 긴급보수	경계석개체L= 100M 인도정비 A= 692m'	16	98. 7. 4 ~ 98. 7.21	100
두류3동사무소~ 두류정수장간 인도 정비	경계석개체L= 412M 인도정비 A=1,397m'	59	98. 8. 5 ~ 98.10. 3	100 (구 청 장 포괄사업)

3. 가로등, 보안등 설치현황 및 수선비 지출내역

□ 가로등 현황

(단위 : 등수)

구분 노선별	계	램 프			점멸기	비 고
		150W	250W	400W		
계	6,904	223	4,404	2,277	221	
성 당 로	95	11	48	36	4	
월 배 로	308		25	283	13	
구 마 로	182		182		6	
대 서 로	210		198	12	8	
당 산 로	112		112		7	
성 서 로	173		131	42	5	
중 흥 로	25		25		1	
와 룡 로	116		26	90	6	
앞산순환도로	422		230	192	7	
두류공원로	116		31	85	5	
대명천복개도로	76		76		5	
월배공단진입도로	60		60		4	
파 도 고 개	36		36		2	
성 서 공 단	1,231		604	627	51	
월 성 택 지	267		121	146	9	
상 인 택 지	333		248	35	9	
성 서 택 지	1,128	88	941	99	19	
대 곡 택 지	320	70	63	187	5	
용 산 택 지	276	6	132	138	10	
성서과학산업단지	534		404	130	12	
장 기 로	101		65	36	3	
용산지하차도	317	48	265	4	2	
이 면 도 로	466		381	85	28	

※ 가로등 수선비는 대구광역시에서 지출

□ 보안등 설치현황

(단위 : 등수)

동 별	보안등수	계	공 중			비 고
			신설	이설	개체	
계	6,966	194	167	12	15	
성 당 1 동	281	8	2	3	3	
성 당 2 동	370	13	6		7	
두 류 1 동	344	3	3			
두 류 2 동	477	10	10			
두 류 3 동	272					
본 리 동	186	3	1	1	1	
감 삼 동	609	7	3	1	3	
죽 전 동	555	4	4			
장 기 동	411	36	36			
이 곡 동	206	31	31			
신 당 동	441	10	10			
월 성 1 동	251	12	11	1		
월 성 2 동	19					
진 천 동	638	21	21			
상 인 1 동	124					
상 인 2 동	499	11	9	1	1	
상 인 3 동	92	2		2		
도 원 동	60	1	1			
송 현 1 동	538	3	1	2		
송 현 2 동	399	13	12	1		
본 동	194	6	6			

※ 보안등수 신설분 포함

□ 보안등 수선비 지출내역

(단위 : 천원)

동 별	보안등수	예 산 배정액	집행액	잔 액	수리건수	비고
계	6,966	140,300	83,986	56,314	3,686	
성 당 1 동	281	4,000	1,979	2,021	93	
성 당 2 동	370	7,500	4,709	2,791	218	
두 류 1 동	344	6,500	3,902	2,598	155	
두 류 2 동	477	10,800	7,105	3,695	299	
두 류 3 동	272	7,000	3,744	3,256	148	
본 리 동	186	5,500	3,324	2,176	127	
감 삼 동	609	13,000	8,904	4,096	405	
죽 전 동	555	10,000	6,764	3,236	269	
장 기 동	411	8,000	3,695	4,305	165	
이 곡 동	206	2,000	526	1,474	36	
신 당 동	441	8,000	3,278	4,722	132	
월 성 1 동	251	6,000	2,998	3,002	143	
월 성 2 동	19	500	264	236	9	
진 천 동	638	11,500	8,842	2,658	395	
상 인 1 동	124	2,000	878	1,122	106	
상 인 2 동	499	10,000	5,189	4,811	238	
상 인 3 동	92	3,000	1,093	1,907	43	
도 원 동	60	2,000	835	1,165	38	
송 현 1 동	538	9,000	6,494	2,506	277	
송 현 2 동	399	8,500	6,146	2,354	249	
본 동	194	5,500	3,317	2,183	141	

4. 하천 및 도로부지 점용허가에 따른 사용료 부과 · 징수현황

〈'95년도〉

☐ 도로부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		징 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	1,118	-	1,118	906,901	1,037	865,788	95.4	
보 차 도	920	920개소	920	399,786	859	361,117		
승차권판매소	21	32개소	21	294	21	294		
사설안내표지	92	92개소	92	4,275	81	3,735		
한 전	2	15,546m	2	61,080	2	61,080		
통신공사	4	367,318	4	271,842	4	271,842		
도시가스	1	95,793m	1	92,066	1	92,066		
기 타	78	78개소	78	77,558	69	75,654		

☐ 하천 · 구거부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		징 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	306	262,696	306	48,196	279	44,657	92.6	
하 천	240	260,265	240	39,872	216	37,024		
구 거	66	2,431	66	8,324	63	7,633		

〈'96년도〉

□ 도로부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		징 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	1,304	-	1,304	1,103,308	1,109	1,020,759	92.5	
보 차 도	992	992개소	992	526,641	834	457,222		
승 차 권 판 매 소	34	54개소	34	457	34	457		
사설안내 표 지	107	107개소	107	5,254	100	4,911		
한 전	2	전주 9,307본 관로 19,147m	2	60,091	2	60,091		
통신공사	6	전주 6,492본 공중전화 316대 관로 99,485m	6	292,665	6	292,665		
도시가스	1	관로 101,845m	1	97,940	1	97,940		
난방공사	1	관로 9,100m	1	51,638	1	51,638		
기 타	161	161개소	161	68,622	131	55,835		

□ 하천구거부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		징 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	205	120,053	205	60,380	180	54,540	90.3	
하 천	144	119,158	144	46,264	131	42,778		
구 거	61	895	61	14,116	49	11,762		

〈'97년도〉

☐ 도로부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		정 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	1,635	-	1,635	1,431,897	1,545	1,275,581	89.1	
보 차 도	1,366	1,366개소	1,366	797,997	1,203	668,853		
승 차 권 판 매 소	41	41개소	41	537	41	537		
사설안내 표지	129	129개소	129	6,333	129	6,333		
한 전	2	전주 11,800본 관로 20,038m	2	67,693	2	67,693		
통신공사	6	전주 6,812본 공중전화 419대 관로412,735m	6	306,600	6	306,600		
도시가스	1	관로115,564m	1	113,655	1	113,655		
난방공사	1	관로 12,918m	1	50,067	1	50,067		
기 타	89	189개소	189	89,015	162	61,823		

☐ 하천구거부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부 과		정 수		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	199	17,113	199	82,137	182	75,102	91.4	
대 지	183	13,511	183	56,574	166	49,539		
공 작 물	16	3,602	16	25,563	16	25,563		

〈'98년도〉

□ 도로부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부과현황		징수현황		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	1,817	-	1,817	1,463,895	1,526	1,215,386	83	
보 차 도	1,570	1,570개소	1,570	844,361	1,303	602,530		
승 차 권 소	46	46개소	46	554	46	554		
사설안내표	141	141개소	141	6,796	141	6,796		
한 전	2	전주 12,815본 관로 18,728m	2	68,829	2	68,829		
통신공사	7	전주 6,650본 공중전화 446대 관로 427,619m 시티폰 219개	7	318,412	7	318,412		
도시가스	1	관로 138,771m	1	133,032	1	133,032		
난방공사	1	관로 54,863m	1	54,863	1	54,863		
기 타	49	49개소	49	37,048	25	30,370		

□ 하천구거부지

(단위 : 천원)

점 용 현 황			부과현황		징수현황		비율 (%)	비고
구 분	건수	점용개요	건수	금액	건수	금액		
계	195	17,621	195	82,664	169	69,752	84.3	
대 지	182	15,264	182	62,403	156	49,491		
공 작 물	13	2,357	13	20,261	13	20,261		

5. 도로굴착 원상복구 원인자부담금 집행현황 및 원상복구후 하자보수 실적

☐ 도로굴착 원상복구 원인자 부담금 집행현황

(단위 : 백만원)

계	내역	집 행 내 역		비 고
		차도 · 인도블럭 복구	이스팔트 복구	
계	18 건	16 건	2 건	
집행액	731	250	481	

☐ 도로굴착 원상복구 후 하자보수 실적

위 치	보 수 내 역	보수기간	비 고
계 : 13개소	-	-	
본동 619번지의 3개소	아스팔트 A = 25m'	98. 4.25 ~ 5.10	
송현동 257-2번지선	인도블럭 A = 40m'	98. 4.25 ~ 4.30	
죽전동 200-7번지선	인도블럭 A = 100m'	98. 4.25 ~ 4.30	
상인동 1555-1번지선	아스팔트 A = 20m'	98. 6.10 ~ 6.17	
감삼동 108-19번지선	아스팔트 A = 30m'	98. 6.10 ~ 6.17	
성서공단 쌍용양회 주변의 1개소	아스팔트 A = 60m'	98.10.18 ~ 10.27	

6. 과불보상금 환수현황

(단위 : 원)

구 분 (연도별)	총 과불액		회 수 액		미회수액		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
계	471	1,845,056,693	341	1,366,108,408	130	478,948,285	
'92	28	56,562,810	27	54,167,810	1	2,395,000	
'93	12	31,349,000	11	31,024,000	1	325,000	
'94	31	77,768,940	26	61,301,850	5	16,467,090	
'95	98	523,629,280	92	494,569,280	6	29,060,000	
'96	93	396,367,700	81	359,191,700	12	37,176,000	
'97	195	635,371,163	100	262,624,468	95	372,746,695	
'98	14	124,007,800	4	103,229,300	10	20,778,500	

7. 풍수해 및 설해대책용 자재구입 및 사용현황

품 목	단위	구입 및 사용현황				보관장소		비 고
		이월	구입	사용	잔량	구본청	동	
염화칼슘	포	1,405	900	1,235	1,070	852	218	
모 래	m'	156	140	195	101	101	-	시설안전 관리소지원
삼	개	202	-	-	202	50	152	
P.P포대	매	5,280	-	-	5,280	3080	220	
말 목	개	156	-	-	156	100	56	
비닐끈	타래	290	300	220	370	200	170	

8. 각종 건설사업 설계변경에 따른 추가공사비 집행내역

공 사 명	사업개요	공 사 비 (백만원)	변경내역	변경사유
계 : 6건		당초:1,599 변경:1,680 증감:증81		
월배로~월성동간 도로건설공사	도로건설 B= 8M L= 120M	당초:39 변경:40 증 : 1	· 콘크리트깨기 당초 : 9m' 변경 : 14m'	· 콘크리트깨기추가
진천동 유천마을 진입도로 건설공사	도로건설 B= 6M L= 100M	당초:70 변경:71 증 : 1	· 흙관부설 당초:511.8M 변경:525.8M	· 도로횡단흙관 추가
진천동 진천초등 서편 도로건설공사	도로건설 B= 8M L= 120M	당초:42 변경:46 증 : 4	· 차선도색 당초: - 변경:L=101M	· 삼거리→네거리 로 노면표시 조정
대명천 복개공사 (와룡료~장기택지 지구, 1차)	· 압거 4.0×4.5 × 5련 L=165M	당초:1,380 변경:1,454 증 : 74	· 압거연장 L=134m→ 165m · 기존석축 폐기물처리 →사토처리	· 사업비 집행잔액 으로 복개L=134m 로계획하였으나 L=165m로추가 연장
진천동 월배천주교 회 주변 포장 및 하 수도 개체공사	· 하수도 (D300m ~400m/m L=263M · 소형고 압블럭 포장 A=1,071m'	당초:40 변경:42 증 : 2	· 하수도 축소 L=268m→ 263m · 포장 A=1,025m' →1,071m' 증가	· 기존노후차도 블록 포장을 소 형고압블럭 포 장으로 시공 · 상태양호한 U형 하수도는 제외 (L=6m감)
성당동 825-16번지 선 인도블럭 개체 공사	인도정비 B=3.8M L=289M	당초:28 변경:27 감 : 1	· 가로수 보호 덮개 설치 당초:30개소 변경: -	· 가로수분대 설치제외

9. 보차도 설치허가 현황 및 사용료 징수현황

☐ 4.하천 및 도로부지 점용허가에 따른 사용료 부과 · 징수현황

(’95년이후)의 도로부지 점용허가 및 사용료 부과 · 징수현황과 같음.

10. 교통유발부담금 부과·징수 및 체납현황

☐ 법적근거 : 도시교통정비촉진법 제21조

☐ 부과내역

○ 부과면적 : 연면적 1,000㎡이상의 건물

○ 납 기 : 매년 9. 16 ~ 9. 30까지

☐ '98년도 교통유발부담금부과·징수 내역

○ 부 과 : 844건 / 525,621천원

○ 징 수 : 720건 / 442,217천원

○ 향후조치사항 : 124건 / 103,404천원에 대해서는 체납자에 대한
징수독려와 재산압류조치

☐ 연도별 부과 및 징수현황

(단위 : 천원)

연도	부 과 액		징수실적		체납액		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
계	3,379	1,462,306	3,193	1,337,942	186	124,364	91.49
'95년	1,137	226,943	1,110	224,421	27	2,522	98.88
'96년	652	241,710	643	237,633	9	4,077	98.31
'97년	746	468,032	720	453,671	26	14,361	96.93
'98년	844	525,621	720	442,217	124	103,404	80.32

※ '98년도는 경기침체로 인한 사업부도등으로 체납자 증가

11. 불법 주·정차 단속실적 및 과태료 징수 현황

□ 근거법령

○ 도로교통법 제28조, 제29조, 제30조를 위반 동법115조의 3에 의거 부과

□ 불법 주·정차 단속실적

노 선 별	단 속 구 간	연 장	단속건수	비 고
계	16 개 지 역	47.7km	34,146	
성당로지역	내당네거리~서부정류장	3.3 km	1,501	
대서로지역	반고개네거리~죽전네거리	3.8 km	7,524	
파도고개로 지역	성당시장 앞~황제예식장	1.5 km	672	
두류공원로 지역	두류네거리~두류공원 네거리	1.6 km	1,433	
구마로지역	서부정류장~남대구I.C	2.7 km	2,322	
북개도로 지역	성당1동사무소~본리파출소	1.9 km	1,378	
당산로지역	감삼네거리~동본리네거리	2.0 km	1,142	
성서로지역	죽전네거리~계명대학교앞	4.2 km	2,418	
이곡, 신당 지역	계대동문, 와룡상가, 먹거리 골목등	3.7 km	2,484	
성서공단로 지역	대구은행성서지점~갑을합섬(주) 남대구I.C~쌍용주유소 등	5.1 km	1,636	
와룡로지역	죽전파출소~본리네거리	2.4 km	1,764	
월배로지역	서부정류장~달성군경계	4.9 km	3,025	
학산로지역	삼일호텔~서한아파트앞	2.6 km	1,450	
앞산순환도로	매자골~달비골입구	2.9 km	835	
상인동지역	영남고네거리~달비골입구 서울은행~대동상가	3.4 km	2,199	
대곡동지역	대동상가~대곡아파트내	1.7 km	2,363	

□ 주차위반과태료 부과징수 현황

(단위 : 원)

년 도	부 과		징 수		체 납		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
계	283,719	10,503,352	204,882	7,422,917	78,837	3,080,435	71
'90	2,340	74,840	2,167	69,380	173	5,460	93
'91	13,086	415,320	12,531	399,970	555	15,350	96
'92	18,290	559,157	16,472	504,087	1,818	55,070	90
'93	18,079	542,366	15,836	468,956	2,243	73,410	86
'94	32,458	973,740	26,260	787,760	6,198	185,980	81
'95	55,686	2,041,530	44,588	1,633,665	11,098	407,865	80
'96	45,842	1,884,879	34,184	1,602,909	11,658	481,970	74
'97	63,792	2,612,570	39,593	1,616,270	24,199	996,300	62
'98	34,146	1,398,950	13,251	539,920	20,895	859,030	39


12. 폐·방기차량 수거 및 단속실적

□ 근거법령 : 자동차관리법 제26조, 제81조

□ 수거실적

발생대수	자진처리	수거조치	비고
486	71	415	

□ 폐·방기차량 발생시 처리절차

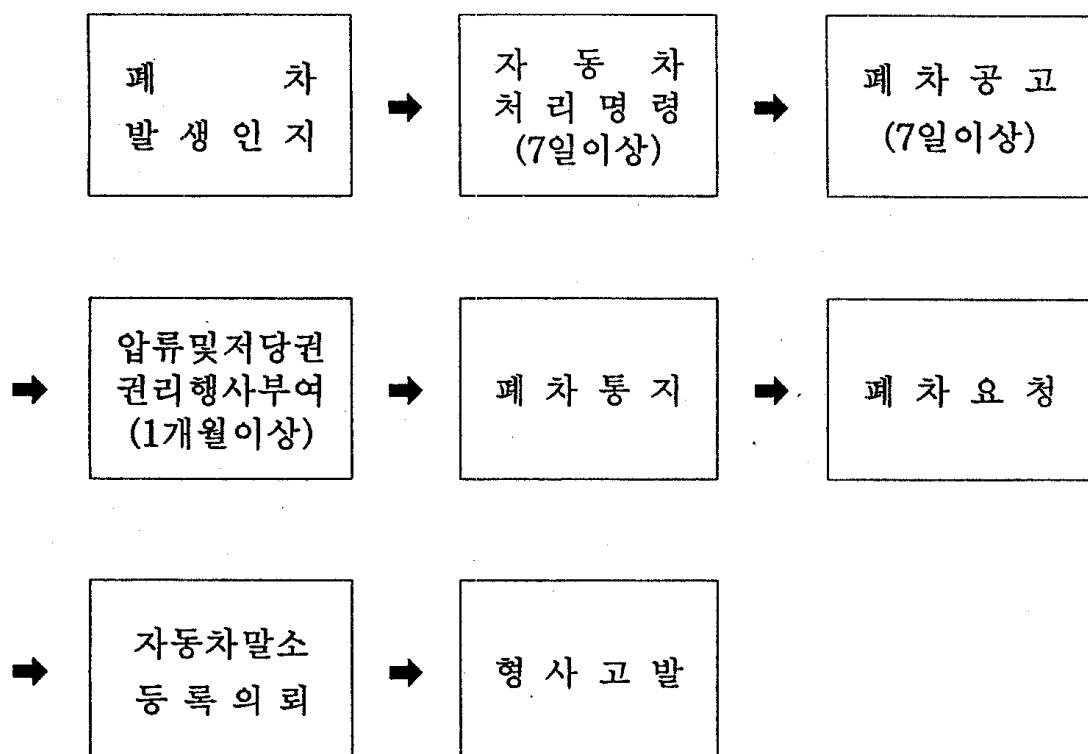

13. 견인대행업소 견인수수료 및 지출현황

(단위 : 원)

월 별	견인대수	수 입	지 출	비 고
계	8,653	192,953,600	192,953,600	
1월	545	12,614,600	12,614,600	
2월	742	16,823,500	16,823,500	
3월	933	20,717,800	20,717,800	
4월	893	20,280,700	20,280,700	
5월	935	20,670,400	20,670,400	
6월	687	15,743,400	15,743,400	
7월	1,051	22,306,800	22,306,800	
8월	1,043	23,440,600	23,440,600	
9월	966	21,351,200	21,351,200	
10월	858	19,004,600	19,004,600	

14. 상인·두류공영 주차장관리 및 운영실적

□ 현 황

주차장명	소재지	설치 년도	소요 예산	관리 인원	시 설 물 내 역				비고
					층수	면적 (㎡)	주차 대수	이용시간	
두류공영 주차장	두류1동 1213	'97. 10월	516 백만원	1 (2)	1층	1,017	34	06:00 ~24:00 (18시간)	
상인공영 주차장	상인1동 1510	'98. 4월	2,645 백만원	3 (4)	지하1층 지상4층	1,997	282	00:00 ~24:00 (24시간)	

※ ()안의 수는 공익근무요원임.

□ 주차장 이용현황 및 수익금

(단위:대,천원)

월 별	주 차 대 수			수 익 금		
	계	상인공영	두류공영	계	상인공영	두류공영
계	29,443	17,702	11,741	26,412	11,875	14,537
1월	1,147	-	1,147	1,792	-	1,792
2월	752	-	752	1,330	-	1,330
3월	1,046	-	1,046	1,667	-	1,667
4월	1,296	366	930	1,942	467	1,475
5월	2,006	927	1,079	2,902	1,229	1,673
6월	2,400	1,267	1,133	2,918	1,216	1,702
7월	4,204	2,934	1,270	2,912	1,913	999
8월	4,788	3,416	1,372	3,334	2,170	1,164
9월	5,617	4,260	1,357	3,699	2,482	1,217
10월	6,187	4,532	1,655	3,916	2,398	1,518

15. 버스 승강장 및 부대시설 설치·정비 내역

☐ 승강장 현황

(단위:개소)

계	시 내 버 스						택 시			
	유 개 시 설			무 개 시 설			유 개 시 설			무개 시설
	소계	신모형	FRP	소계	도시형	공형	소계	대형	신모델	
287	17	7	10	265	160	105	4	-	4	1

☐ 대기의자 설치 현황 : 181개소, 350개

※ '98년 설치예정 20개소 40개포함

☐ 대기의자 정비 : 161개소, 310개('98. 11월예정)

☐ 향후계획

○ 대기의자 신설 : 10개소, 20개

○ 대기의자 정비 : 181개소 350개

○ 유개버스승강장 설치 : 2개소

16. 차고지관리 및 지도감독 내역

☐ 법적근거 : 화물자동차운수사업법 시행규칙 제5조의 근거

☐ 차고지를 설치해야할 이유

○ 화물자동차운송사업을 하고자하는 자는 차고지확인신청서를
주사무소가 있는 관할 시·군(구)내 차고지(주사무소와 차고
지 주소가 상이하여도 관계없음)신청토록 되어 있음

○ 증명발급 : 14일

☐ 차고지 현황☐ 업종별 차고지 현황

계	개인택시	개별화물	개인용달	특수화물	법인화물	비 고
2,854	2,206	449	195	3	1	

☐ 차고지 확인발급 및 관리감독 : 동사무소 및 구청

☐ 동사무소 차고지 발급(3개업종) : 개인택시, 개별화물, 개인용달

☐ 구 발급(2개업종) : 법인여객(버스, 택시) 및 법인화물, 특수화물

17. 자동차운수사업법 지도·감독 내역

(화물자동차 적발단속 및 과징금 부과통지 현황 포함)

☐ 법적근거

☐ 여객자동차운수사업법 제22조 및 제28조

☐ 화물자동차운수사업법 제19조

☐ 자동차 현황

총대수	여객자동차						개 인 택 시	화 물 자동차
	소 계		버 스		택 시			
	업체수	대수	업체수	대수	업체수	대수		
7,005	47	3,045	7	394	40	2,651	2,476	1,484

☐ 지도 및 단속 내역

☐ 법규위반자 : 행정지도 및 행정처분실시(과태료, 과징금처분)

□ 행정처분 내역

(단위 : 천원)

구 분	징수결정액		수납액		채납액		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
계	297	65,900	112	25,600	185	40,300	
과징금	244	55,450	92	21,800	152	33,650	
과태료	53	10,450	20	3,800	33	6,650	

18. 불법 노숙차량 지도단속 실적 및 과태료 징수현황

□ 근거법령 : 도로교통법 제28조, 제29조, 제30조

□ 지도 단속 및 과태료부과 현황

(단위 : 천원)

단속실적	부 과		징 수		징수율 (%)	비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액		
2,385건	2,385	119,250	1,406	70,300	57%	
